

**广西华侨学校 2018-2020 办学达标项目
审计报告
祥浩会事财字（2021）第 0216 号**

祥浩会计师事务所有限责任公司

防伪编号： 2021060917492342077
报告文号： 祥浩会事财字(2021)第0216号
委托单位： 广西华侨学校
被审验单位名称： 广西华侨学校
事务所名称： 祥浩会计师事务所有限责任公司
报告类别： 专项审计（其他专项审计）
报告日期： 2021-06-07
报备时间： 2021-06-09 17:49:23
签名注册会计师： 咸海波 朱石泉
报备状态： 审核通过



广西华侨学校

广西华侨学校2018-2020办学达标项目审计报告

事务所名称： 祥浩会计师事务所有限责任公司
事务所电话： 0771-5509810
电子邮箱： xhreport@xhcpa.net
通讯地址： 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心21层2117-2123号

本防伪编号仅证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的会计师事务所出具。
业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。

PC端防伪查询网址：<http://www.gxicpa.com:9008/report-ic#/query/report/>

目 录

广西华侨学校 2018-2020 办学达标项目审计报告

1-25



祥浩
XIANGHAO

祥浩会计师事务所有限责任公司
中国广西南宁市青秀区金湖路59号
南宁地王国际商会中心21层
www.xhcpa.net

审计报告

祥浩会事财字（2021）第 0216 号

广西华侨学校：

根据《自治区教育厅关于开展 2018-2020 年中等职业学校办学条件达标项目验收工作的通知》桂教职成[2021]9 号文件的要求，我们接受委托，对广西华侨学校 2018-2020 办学条件达标项目进行审计。

广西华侨学校的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，按照相关规定编制项目预算执行情况表、资金使用管理及绩效情况表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目投入支出情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对广西华侨学校 2018-2020 办学条件达标情况发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定计划和实施审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对项目预算执行、资金使用管理及绩效情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们结合贵校的实际情况，实施了包括审阅项目相关材料、检查会计账簿凭证等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：

一、审计依据

1、《中华人民共和国预算法》



- 2、《中华人民共和国会计法》
- 3、《中国注册会计师审计准则》
- 4、《政府会计准则》
- 5、《广西华侨学校 2018 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》
- 6、《广西华侨学校 2019 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》
- 7、《广西华侨学校 2020 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》
- 8、《自治区教育厅关于开展 2018-2020 年度中等职业学校办学条件达标项目验收工作的通知》（桂教职成[2021]9 号）
- 9、《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》

二、审计内容

本次审计对广西华侨学校 2018-2020 办学条件达标情况中，项目预算执行情况表、资金使用管理及绩效情况表进行审计。

三、基本情况

学校基本情况

广西华侨学校原名“南宁归国华侨学生中等补习学校”，是 1960 年 6 月在周恩来总理的亲切关怀下，原中侨委为了帮助从印度尼西亚、缅甸、越南、马来西亚等 8 个国家归国的华侨青年学生克服语言障碍、学习祖国文化、实现平稳过渡而创办的，是全国侨务系统五所侨校之一，隶属于自治区党委统战部。2000 年成为国务院侨办首批华文教育基地，2003 年，学校转型为普通中专，并更名为“广西华侨学校”。2015 年定为国家中等职业教育改革发展示范学校，2018 年获评自治区首批四星级中等职业学校，2018 年 8 月被中国侨联、国务院侨办联合授予“全国侨联系统先进组织”荣誉称号，2019 年成为中国侨联中国华侨国际华文交流基地。

广西华侨学校现占地面积约 435,917.55 平方米，有 18 个专业，其中 11 个专业在校生达 200 人以上。现有学历教育在校生人数 5230 人，教职工 309，专任教师 295 人（含外聘教师），师生比 1:17.73。

四、项目建设情况

（一）项目目标设定情况

根据《国家教育事业发展的第十三个五年规划》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划（2018-2020 年）的通知》精神，广西华侨学校进一步明确了奋斗目标和建设任务，全面加强学校硬软件建设，努力提升学校办学水平，把学校建设成为“国际知名、国内示范、区内一流、中外融合”的国家级品牌示范特色学校。学校计划到 2020 年底，办学条件达到《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》的Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求。

审计组根据广西华侨学校 2018-2020 年中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书以及《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》的Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求，梳理出学校到 2020 年底的建设目标，如下表所示：

建设内容	关键指标	建设目标
办学规模	学历教育在校生数（人）	5000
基础设施条件建设	校园占地面积（m ² ）	680 亩（约 453333 平方米）
	校舍建筑面积（m ² ）	91460.38
	体育卫生生活等设施	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障。
	图书配备（册、种）	16.01 万册
实训条件建设	仪器设备（元）	32,970,000.00
	实习实训基地（个）	4
	信息化教学设备（台）	995
师资队伍建设	专任教师人数（人）	280
	专业教师数（人）	194
	师生比	1:17.68
	兼职教师（人）	48
专业建设	在校生达 200 人以上专业数量（个）	13



建设内容	关键指标	建设目标
内部管理制度与组织机构	内部管理制度与组织机构	制订、修订和完善一系列学校管理规章制度，实现管理制度化建设。并汇编成册。

(二) 项目目标完成情况

对照任务书中明确的建设内容，审计组梳理、核对了截止 2020 年 12 月 31 日广西华侨学校中等职业学校办学条件达标项目建设成效情况，除校园占地面积、仪器设备、信息化教学设备、师生比和在校生达 200 人以上专业数量外，其余建设目标均已完成，具体情况如下表所示：

建设内容	关键指标	2020 年底建设目标	2020 年完成情况	是否完成目标
办学规模	学历教育在校生数(人)	5000	5230	是
基础设施条件建设	校园占地面积(m ²)	680 亩 (约 453,333.00 平方米)	435,917.55	否
	校舍建筑面积(m ²)	91,460.38	130,190.74	是
	体育卫生生活等设施	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障。	标准塑胶运动场已建成达到可使用状态；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障。	是
	图书配备(册、种)	160,100.00	167,360.00	是
实训条件建设	仪器设备(元)	32,970,000.00	30,454,700.00	否
	实习实训基地(个)	4	4	是
	信息化教学设备(台)	995	812.00	否
师资队伍建设	专任教师人数(人)	280	295	是
	兼职教师(人)	48	48	是
	专业教师数(人)	194	197	是
	师生比	1:17.68	1:17.73	否
专业建设	在校生达 200 人以上专业数量(个)	13	11	否
内部管理制度与组织机构	内部管理制度与组织机构	制订、修订和完善一系列学校管理规章制度，实现管理制度化建设。并汇编成册。	学校内部管理体制、运行机制、教职工、学生管理、教育教学管理、校产和财务管	是

建设内容	关键指标	2020 年底建设目标	2020 年完成情况	是否完成目标
			理、教育教学机构、管理机构等健全。	

以下是对未完成建设目标的指标的核实情况说明：

1、基础设施条件建设-校园占地面积

广西华侨学校 2020 年任务书第二部分项目建设任务（二）年度建设目标显示，校园占地面积的建设目标为 2020 年 12 月达到 680 亩（约 453333 平方米）。

审计组获取广西华侨学校土地使用证，核实学校实际占地面积合计 435,917.55 平方米，生均占地面积为 83.35 平方米，其中，位于广西-东盟经济技术开发区（南宁市教育园区西片区）发展大道与定合南路交界处西南侧）土地证号为地字第 450107201830059 号地块面积 276,887.23 平方米；位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号，土地证号为南宁国用（2013）第 612436 号地块面积 37,666.37 平方米；位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号，土地证号为南宁国用（2013）第 612652 号地块面积 121,363.95 平方米。学校实际占地面积小于任务书列示的目标占地面积，差异为 17,415.45 平方米，未完成项目建设目标。

2、实训条件建设-仪器设备

广西华侨学校 2020 年任务书第二部分项目建设任务（二）年度建设目标显示，仪器设备的建设目标为 2020 年 12 月达到 32,970,000.00 元。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的固定资产清单，加计汇总、现场抽盘，核对了学校现有仪器设备 30,454,700.00 元，小于任务书的建设目标，差异为 2,515,300.00 元，未完成项目建设目标。

3、实训条件建设-信息化教学设备

广西华侨学校 2020 年任务书第二部分项目建设任务（二）年度建设目标显示，信息化教学设备的建设目标为 2020 年 12 月达到 995 台。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的固定资产清单，加计汇总、现场抽盘，核对了学校现有信息化教学设备 812 台，未完成项目建设目标。

4、师资队伍建设-师生比

广西华侨学校 2020 年任务书第二部分项目建设任务（二）年度建设目标显示，师资队伍建设的目标为 2020 年 12 月专任教师 280 人，专业教师 194 人，师生比 1:17.68。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的教师花名册，抽查相关资料，核对了学校现有专任教师 295 人，兼职教师 48 人，专任教师师生比 1:17.73，专任教师师生比大于任务书的建设目标，未完成项目建设目标。

5、专业建设-在校生达 200 人以上专业数量

广西华侨学校 2020 年任务书第二部分项目建设任务（二）年度建设目标显示，专业建设-在校生达 200 人以上专业数量 2020 年 12 月达到 13 个。

审计组获取相关获奖资料，核对了截止 2020 年 12 月 31 日学校在校生达 200 人以上专业的数量为 11 个，未完成项目建设目标。

（三）项目达标情况

对照任务书中明确的建设内容，审计组梳理、核对了截止 2020 年 12 月 31 日广西华侨学校中等职业学校办学条件达标项目建设成效情况，除在校生达 200 人以上专业数量外，其余指标均已达到广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》的 III 级（卓越-发达地区水平）要求，具体情况如下表所示：

建设内容	关键指标	建设分级标准 III 级要求	2020 年完成情况	是否达标
办学规模	学历教育在校生数（人）	3600	5230	是
基础设施条件建设	校园占地面积（m ² ）	生均不低于 39	435,917.55（生均 83.35）	是
	校舍建筑面积（m ² ）	生均不低于 21	130,190.74（生均 24.90）	是
	体育卫生生活等设施	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障。	标准塑胶运动场已建成达到可使用状态；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障。	是
	图书配备（册、种）	生均 32 册以上	167,360.00（生均 32）	是
实训条件建设	仪器设备（元）	生均实训设备值，工科专业和医药类专业不低于 6000 元，其他专业不低于 4500 元。	30,454,700.00（生均 5823.08）	是
	实习实训基地	无要求	4	不



建设内容	关键指标	建设分级标准Ⅲ级要求	2020年完成情况	是否达标
	(个)			适用
	信息化教学设备(台)	学生用计算机达 15 台/100 人	812.00 (15.53 台/100 人)	是
师资队伍建设	专任教师人数(人)	专任教师师生比在 1:18 以内,	295 (师生比 17.73)	是
	兼职教师(人)	无要求	48	不适用
	专业教师数(人)	不低于专任教师数的 60%。	197 (是专任教师数的 66.78%)	是
	师生比	1: 18 以内,	1:17.73	是
专业建设	在校生达 200 人以上专业数量(个)	在校生达 200 人的专业数占专业总数 70%以上	11 (占专业总数的 61.11%)	否
内部管理制度与组织机构	内部管理制度与组织机构	制订、修订和完善一系列学校管理规章制度, 实现管理制度化建设。并汇编成册。	学校内部管理体制、运行机制、教职工、学生管理、教育教学管理、校产和财务管理、教育教学机构、管理机构等健全。	是

经确认, 广西华侨学校 2021 年任务书中办学现状的编制基础是学校 2020 年底的办学情况, 故审计组以 2021 年任务书的办学现状为基础数据, 进行核实, 以下是对各项指标的核实情况说明:

1、办学规模-学历教育在校生数

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示, 学校现有学历教育在校生人数为 5000 人, 对应Ⅲ级标准要求“学历教育在校生人数 3600 人以上”, 已经达到Ⅲ级标准。

审计组获取广西华侨学校在校学生花名册, 检查相关资料, 核实了广西华侨学校 2020 年在校生数为 5230 人, 超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准(试行)》Ⅲ级(卓越-发达地区水平)要求的在校生人数 3600 人, 已经达到Ⅲ级标准。

2、基础设施条件建设-校园占地面积

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示, 学校现占地面积 680 亩(约 453333 平方米), 生均占地面积为 90.67 平方米, 已达到建设Ⅲ级标准。

审计组获取广西华侨学校土地使用证，核实学校实际占地面积合计 435,917.55 平方米，生均占地面积为 83.35 平方米，其中，位于广西-东盟经济技术开发区（南宁市教育园区西片区）发展大道与定合南路交界处西南侧）土地证号为地字第 450107201830059 号地块面积 276,887.23 平方米；位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号，土地证号为南宁国用（2013）第 612436 号地块面积 37,666.37 平方米；位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号，土地证号为南宁国用（2013）第 612652 号地块面积 121,363.95 平方米。学校实际占地面积小于任务书列示的占地面积，差异为 17,415.45 平方米。

根据核实的实际占地面积（435,917.55 平方米）以及在校生人数（5230 人），计算得出广西华侨学校生均占地面积 83.35 平方米，超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的生均占地面积 39 平方米，已经达到Ⅲ级标准。

3、基础设施条件建设-校舍建筑面积

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，学校现有校舍面积为 105,827.03 平方米，生均建筑面积为 21.16 平方米，已达到Ⅲ级标准要求。

广西华侨学校的建筑物均没有房产证，审计组通过获取学校截止 2020 年 12 月 31 日的固定资产卡片账以及实地盘点、观察、查阅相关资料，核对了学校达到可使用状态的校舍建筑物面积为 130,190.74 平方米，生均建筑面 24.90 平方米，超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的校舍建筑面积生均不低于 21 平方米，已达到Ⅲ级标准要求。

6、基础设施条件建设-体育卫生生活等设施

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，学校现有标准的 400 米环形跑道，是设有看台的标准塑胶运动场，有种植天然草坪的标准足球场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障，达到建设Ⅲ级标准。

审计组通过实地观察、查阅相关资料核对了学校标准塑胶运动场（有 400 米环形跑道、设有看台）已建成使用，体育、卫生、生活等设施符合《学校体



育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求，校园安全有保障，已经达到Ⅲ级标准。

7、基础设施条件建设-图书配备

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，学校现有图书 16.13 万册，生均 32 册，其中专业图书数量为 66153 册，超过总图书数量的 1/3；电子书 17 万册，生均图书数量达到Ⅲ级标准。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的图书清单，加计汇总、现场抽盘，核对了学校现有图书 167,360.00 册，生均 32.00 册，达到《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的生均 32 册，已达到Ⅲ级标准。

8、实训条件建设-仪器设备

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，学校现有实训设备总值 30,454,700.00 元，生均实训设备值达到 6,090.94 元，已达到Ⅲ级标准。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的固定资产清单，加计汇总、现场抽盘，核对了学校现有仪器设备 30,454,700.00 元，生均 5,823.08 元，超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的工科类专业和医药类专业不低于 6000 元，其他专业不低于 4500 元，已经达到Ⅲ级标准。

9、实训条件建设-实习实训基地

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第三点 2019-2020 年度项目建设总结显示，实习实训基地完善，现有 4 个实训基地，完成预期建设目标。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的实训基地清单，实地走访，核对了学校现有 4 个实训基地，分别是外语实训基地、动漫实训基地、电商实训基地、学前教育实训基地。

10、实训条件建设-信息化教学设备

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，计算机总数 812 台，学生用计算机达到 16.24 台/100 人，达到Ⅲ级标准。



审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的固定资产清单，现场抽盘，核对了学校现有计算机总数 812 台，学生用计算机达到 15.53 台/100 人，超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的学生用计算机达 15 台/100 人，达到Ⅲ级标准。

11、师资队伍建设

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，现有教职工 309，专任教师 282 人（含外聘教师），师生比 1:18，对应Ⅲ级标准要求“专任教师师生比在 1: 18 以内”，已达标。现有专业教师 197 人，专业教师数占专任教师数 69.86%，对应Ⅲ级标准要求“专业教师数不低于专任教师数的 60%”，已达到Ⅲ级标准。

审计组获取广西华侨学校截止 2020 年 12 月 31 日的教师花名册，抽查相关资料，核对了学校现有专任教师 295 人，专业教师 197 人、兼职教师 48 人，专任教师师生比 1:17.73，专业教师数占专任教师数 66.78%，专任教师师生比未超过《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的专任教师师生比在 1:18 以内，已达到Ⅲ级标准。

12、专业建设-在校生达 200 人以上专业数量

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第二点学校办学现状显示，学校现有 18 个专业，有 13 个专业在校生达 200 人以上，达到建设Ⅲ级标准。

审计组获取相关资料，核对了学校现有 18 个专业，其中 11 个专业在校生达 200 人以上，在校生达 200 人的专业数占专业总数的 61.11%，小于《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的在校生达 200 人的专业数占专业总数 70%以上，未达到Ⅲ级标准。

13、内部管理制度与组织机构

广西华侨学校 2021 年任务书第一部分第三点 2019-2020 年度项目建设总结显示，学校内部管理体制、运行机制、教职工、学生管理、教育教学管理、校产和财务管理、教育教学机构、管理机构等健全，完成预期目标。



审计组获取广西华侨学校的制度汇编，核对了学校内部管理体制、运行机制、教职工、学生管理、教育教学管理、校产和财务管理、教育教学机构、管理机构等建立健全。

学校 2017 年至 2020 年每年的项目建设情况如下表所示：

建设内容	关键指标	2017.12 统计数	2018.12 统计数	2019.12 统计数	2020.12 统计数	2018-2020 年增量
办学规模	学历教育在校生数(人)	4,902	4,945	4,950	5,230	328
基础设施条件建设	校园占地面积(m ²)	159,030.32	435,917.55	435,917.55	435,917.55	276,887.23
	校舍建筑面积(m ²)	69,857.08	69,978.31	98,048.09	130,190.74	60,333.66
	体育卫生生活等设施	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》。	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》。	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》。	有 400 米环形跑道的、设有看台的标准塑胶运动场；体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》。	不适用
	图书配备(册、种)	135,400.00	160,100.00	160,100.00	167,360.00	31,960.00
实训条件建设	仪器设备(元)	41,460,000.00	30,870,000.00	32,370,000.00	30,454,700.00	1,1005,300.00
	实习实训基地(个)	4	4	4	4	0
	信息化教学设备(台)	632	692	733	812	180
师资队伍建设	专任教师人数(人)	235	280	280	295.00	60
	兼职教师(人)	16	16	48.	48.00	32
	专业教师数(人)	146	171	194	197	51
	师生比	1:20.86	1:17.66	1:17.68	1:17.73	不适用
专业建设	在校生达 200 人以上专业数量(个)	9.00	14.00	14.00	11.00	2.00



教师、学生技能比赛获得过自治区二等奖以上专业数量(个)	11.00	11.00	11.00	12.00	1.00
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	------

(四) 项目管理情况

为顺利完成建设项目，达到预期目标，学校成立以学校主要领导牵头，分管领导具体负责的工作机构，构建了完善的项目建设和管理机构。项目建设实施工作领导小组根据国家有关政策和要求，领导项目建设工作，研究决定项目建设过程中的重大事项；争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策，征求项目专家指导委员会的意见和建议；全面负责策划、组织、指挥、协调项目建设的各项工作；召开工作推进会，督促检查建设项目工作进展情况；对各部门的申报工作情况进行检查、考核和奖惩；接受上级职能部门监控、检查。领导小组组长为校党委书记。

(五) 项目建设情况小结

广西华侨学校在 2018 至 2020 年三年时间里根据《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》Ⅲ级标准的要求，全面加强学校硬软件建设，努力提升学校办学水平。截止 2020 年底，学校在办学规模、基础设施条件建设、实训条件建设、师资队伍建设和专业建设等各方面均取得了显著成效。除在校生达 200 人以上专业数量外，其余建设指标均已达到《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准》Ⅲ级标准。

五、资金使用管理情况

(一) 资金落实情况

审计组根据广西华侨学校 2018-2020 年中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书及实际情况梳理出广西华侨学校 2018 年至 2020 年三年项目预算资金总额 10,369.49 万元，其中，中职达标专项资金 2,000.00 万元（属于自治区级财政投入资金），德促贷款 2,500.00 万元（属于主管部门及学校自筹资金），东盟校区建设资金 3,343.56 万元（属于自治区级财政投入资金），其他



自治区级财政投入资金 2,525.93 万元。实际到位资金总额 9,672.49 万元，资金到位率 93.28%，具体情况如下：

1、2018 年资金落实情况

广西华侨学校 2018 年预算资金 4,121.73 万元，实际到位资金 4,119.87 万元，资金到位率 99.95%。资金到位率较高，基本完成预算。具体情况如下表所示：

建设内容	资金预算及来源(万元)					实际到位资金(万元)					实际资金到位率(%)
	自治区级财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部 门及学 校自筹	行业企 业投 入	合计	自治区级 财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部 门及学 校自筹	行业企 业投 入	合计	
办学规模	4,121.73	800.00			4,121.73	4,119.87	800.00			4,119.87	99.95
合计											
基础设施 条件建设	学历教育 在校生数										
	校园占地 面积										
	校舍建筑 面积	3,876.56	800.00		3,876.56	3,876.56	800.00			3,876.56	100.00
	体育卫生 生活等设 施					32.43				32.43	
实训条件 建设	图书配备	65.00			65.00	55.90				55.90	86.00
	小计	3,941.56	800.00		3,941.56	3,964.89	800.00			3,964.89	100.59
	仪器设备										
	实习实训 基地										
师资队伍 建设	信息化教 学设备	135.17			135.17	102.85				102.85	76.09
	小计	135.17			135.17	102.85				102.85	76.09
	专任教师	5.00			5.00	9.66				9.66	96.60
	专业教师 师生比	5.00			5.00						
合计	35.00				35.00	42.47				42.47	121.34
	45.00				45.00	52.13				52.13	115.84

2、2019年资金落实情况

广西华侨学校2019年预算资金4,768.84万元，实际到位资金3,962.86万元，资金到位率83.10%。资金到位率较低的原因主要是学校2019年申请的德促贷款资金1,800.00万元，实际只到位了1,006.47万元。具体情况如下表所示：

建设内容	资金预算及来源(万元)					实际到位资金(万元)					实际资金到位率(%)
	自治区级财政投入	其中：中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	自治区级 财政投入	其中：中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	
合计	2,968.84	600.00	1,800.00		4,768.84	2,956.39	600.00	1,006.47		3,962.86	83.10
办学规模											
学历教育 在校生数											
校园占地 面积											
校舍建筑 面积	2,717.00	450.00	1,600.00		4,317.00	2,715.78	450.00	906.52		3,622.30	83.91
基础设施 条件建设											
体育卫生 生活等设 施											
图书配备											
小计	2,717.00	450.00	1,600.00		4,317.00	2,715.78	450.00	906.52		3,622.30	83.91
仪器设备	150.00	150.00			150	151.22	150.00			151.22	100.81
实习实训 基地											
信息化教 学设备	41.84		200.00		241.84	41.84		99.95		141.79	58.63
小计	191.84	150.00	200.00		391.84	193.06	150.00	99.95		293.01	74.78

建设内容	资金预算及来源 (万元)				实际到位资金 (万元)				实际资金到位率 (%)		
	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹	行业企业投入	合计	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹		行业企业投入	合计
师资队伍建设	专任教师人数	10.00			10.00	7.84				7.84	39.20
	专业教师数	10.00			10.00						
	师生比										
	兼职教师	40.00			40.00	39.71				39.71	99.28
小计	60.00			60.00	60.00	47.55			47.55	79.25	

3、2020年资金落实情况

广西华侨学校2020年预算资金1,478.92万元, 实际到位资金1,589.76万元, 资金到位率107.49%。具体情况如下表所示:

建设内容	资金预算及来源 (万元)				实际到位资金 (万元)				实际资金到位率 (%)		
	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹	行业企业投入	合计	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹		行业企业投入	合计
办学规模	合计	778.92	600.00	700.00	1,478.92	1,589.76	598.94			1,589.76	107.49
基础设施条件建设	学历教育在校生数										
	校园占地面积										
校舍建筑面积		440.00	440.00	600.00	1,140.00	598.94	598.94			598.94	52.54

建设内容	资金预算及来源 (万元)					实际到位资金 (万元)					实际资金到位率 (%)	
	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹	行业企业投入	合计	自治区级财政投入	其中: 中专职达标专项资金	主管部门及学校自筹	行业企业投入	合计		
体育卫生生活等设施						824.16				824.16		
图书配备												
小计	440	440.00	600.00		1,140.00	1,423.10	598.94			1,423.10		124.83
仪器设备												
实训条件建设												
实训基地												
信息化教学设备	268.92	160.00	100.00		268.92	108.92				108.92		40.50
小计	268.92	160.00	100.00		268.92	108.92				108.92		40.50
师资队伍建设												
专任教师人数	7.00				7.00							
专业教师数	3.00				3.00							
师生比												
兼职教师	60.00				60.00	47.74				47.74		79.57
小计	70.00				70.00	57.74				57.74		82.49

(二) 资金支出及结余情况

经审计, 广西华侨学校 2018-2020 年中等职业学校办学条件达标项目预算资金 10,369.49 万元, 实际到位资金 9,672.49 万元, 实际支出资金 9,408.03 万元, 2020 年末财政收回综合实训楼项目剩余资金 15.14 万元, 资金结余 249.32 万元, 具体情况如下:

建设内容	资金预算及来源 (万元)				实际支出资金 (万元)					
	自治区级 财政投入	其中: 中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	自治区级 财政投入	其中: 中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计
小计	3,941.56	800.00			3,941.56	1,371.64	771.73			1,371.64
仪器设备										
实习实训 基地										
信息化教 学设备	135.17				135.17	102.85				102.85
小计	135.17				135.17	102.85				102.85
专任教师	5.00				5.00	9.66				9.66
专业教师	5.00				5.00					
师生比										
兼职教师	35.00				35.00	42.47				42.47
小计	45.00				45.00	52.13				52.13

2、2019年资金支出情况

2019年项目预算资金 4,768.84 万元, 实际到位资金 3,962.86 万元, 实际支出资金 4,959.31 万元, 完成预算的 103.99%。其中, 基础设施条件建设实际支出 4,618.75 万元, 占实际支出资金 93.13%; 实训条件建设实际支出 293.01 万元, 占实际支出资金 5.91%; 师资队伍建设实际支出 47.55 万元, 占实际支出资金 0.96%。本年收到的资金本年已使用完毕。实际支出大于实际到位资金的原因是, 2018年结余资金在 2019年使用了部分, 具体支出情况如下表所示:

建设内容	资金预算及来源 (万元)				实际支出资金 (万元)					
	自治区级 财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	自治区级 财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计
办学规模	2,968.84	600.00	1,800.00		4,768.84	4,831.52	127.79			4,959.31
合计										
学历教育 在校生数										
校园占地 面积										
校舍建筑 面积	2,717.00	450.00	1,600.00		4,317.00	4,590.91	27.84			4,618.75
体育卫生 生活等设 施										
图书配备										
小计	2,717.00	450.00	1,600.00		4,317.00	4,590.91	27.84			4,618.75
仪器设备	150.00	150.00			150.00	151.22				151.22
实训条件 建设										
实习实训 基地										
信息化教 学设备	41.84		200.00		241.84	41.84	99.95			141.79
小计	191.84	150.00	200.00		391.84	193.06	99.95			293.01
专任教师	10.00				10.00	7.84				7.84
专业教师	10.00				10.00					
师生比										
兼职教师	40.00				40.00	39.71				39.71
小计	60.00				60.00	47.55				47.55

3、2020年资金支出情况

2020年项目预算资金1,478.92万元，实际收到资金1,589.76万元，实际支出2,922.10万元，达预算的197.58%。其中，基础设施条件建设实际支出2,655.49万元，占实际支出资金90.88%；实训条件建设实际支出208.87万元，占实际支出资金7.15%；师资队伍建设实际支出57.74万元，占实际支出资金1.98%。本年收到的资金本年已使用完毕，实际支出大于实际到位资金的原因是，2018年结余资金在2020年使用了部分，具体支出情况如下表所示：

建设内容	资金预算及来源(万元)				实际支出资金(万元)					
	自治区级 财政投入	其中：中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	自治区级 财政投入	其中：中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计
办学规模	778.92	600.00	700.00		1,478.92	2,110.07	417.90	812.03		2,922.10
基础设施 条件建设	学历教育 在校生数									
	校园占地 面积									
	校舍建筑 面积	440.00	440.00	600.00	1,140.00	1,119.25	417.90	712.08		1,831.33
	体育卫生 生活等设 施					824.16				824.16
实训条件 建设	图书配备									
	小计	440.00	440.00	600.00	1,140.00	1,943.41	417.90	712.08		2,655.49
仪器设备 实习实训 基地										

建设内容	资金预算及来源 (万元)					实际支出资金 (万元)				
	自治区级 财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计	自治区级 财政投入	其中:中 职达标专 项资金	主管部门 及学校自 筹	行业企业 投入	合计
信息化教 学设备	268.92	160.00	100.00		268.92	108.92		99.95		208.87
小计	268.92	160.00	100.00		268.92	108.92		99.95		208.87
师资队伍 建设	7.00				7.00					
专业教师	3.00				3.00	10.00				10.00
师生比										
兼职教师	60.00				60.00	47.74				47.74
小计	70.00				70.00	57.74				57.74

（三）中职达标专项资金

2018年自治区级财政根据部门预算行[2018]1号文,拨付广西华侨学校现代职业教育专项资金(学生宿舍楼)800万元,2018年实际使用771.73万元,资金使用率为96.47%,剩余的28.27万元在2019年使用。2019年自治区级财政根据桂财行函[2019]131号文,拨付广西华侨学校现代职业教育质量提升计划中央资金600万元,2019年实际使用628.27万元,资金使用率为104.71%,资金使用率超过100%的原因是2018年结余资金28.27万元在2019年使用。2020年自治区级财政根据桂财教函[2020]106号文,拨付广西华侨学校自治区现代职业教育发展专项经费598.94万元,实际使用417.79万元,结余181.15万元,资金使用率为69.75%。

2018-2020年财政拨入中职达标专项资金共计1,998.94万元,实际使用1,817.90万元,结余181.04万元,资金使用率为90.94%。中职达标专项资金主要用于校舍建筑面积、信息化教学设备、仪器设备等方面的建设,截止2020年12月31日资金未使用完毕,主要原因是学校计划在2020年底建成的5#学生宿舍楼(总建筑面积为14638.43平方米)和学前教育实训中心(总建筑面积为3538.81平方米),实际未完成建设,项目建设进度缓慢。

2018年至2020年广西华侨学校校舍建筑面积增加28,069.78平方米,信息化教学设备增加120台,除在校生达200人以上专业数量外,信息化教学设备、仪器设备等各方面均已符合《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准(试行)》III级(卓越-发达地区水平)标准,建设成效显著。

（四）资金管理情况

广西华侨学校制定了财务管理制度、档案制度等内部控制制度,实行不相容岗位相分离,出纳、凭证制单人、凭证审核人均不同人员;各项开支基本都经过报批手续,学校制度得到了较好的执行,执行过程中未见重大异常事项。

（五）资金使用情况小结

广西华侨学校2018年至2020年三年项目预算资金总额10,369.49万元,实际到位资金总额9,672.49万元,资金到位率93.28%,实际支出资金总额9,408.03万元,预算执行率90.73%,2020年末财政收回综合实训楼项目剩余资金15.14万元,资金结余249.32万元。其中,2018至2020年三年财政拨入中



职达标专项资金共计 1,998.94 万元,实际使用 1,817.79 万元,结余 181.15 万元,资金使用率为 90.94%。

2018 年至 2020 年广西华侨学校学历教育在校生数增加 328 人,校园占地面积增加 276,887.23 平方米,校舍建筑面积增加 60,333.66 平方米,图书配备增加 31,960 册,信息化教学设备增加 180 台,专任教师增加 60 人,兼职教师增加 32 人,专业教师增加 51 人,教师、学生技能比赛获得过自治区二等奖以上专业数量增加 1 个,除在校生达 200 人以上专业数量外,其余各方面均已符合《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准(试行)》Ⅲ级(卓越-发达地区水平)标准,建设成效显著。

六、审计发现问题

(一) 办学达标建设方案和任务书的资金安排填写有误

广西华侨学校编制的《广西华侨学校 2020 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》第一部分第五点建设进度和资金安排中的(二)资金安排显示 2020 年用于基础设施条件建设-校舍建筑面积建设预算资金总额为 2618.73 万元(其中中职达标专项资金 440 万元、德促贷款 2178.73 万元);任务书第二部分第六点建设资金安排显示 2020 年用于基础设施条件建设-校舍建筑面积建设的自治区级财政投入预算资金为 2618.73 万元,此处填写有误,自治区级财政投入预算资金应为 440 万元,德促贷款 2178.73 万元不属于自治区级财政投入资金,应为主管部门投入及学校自筹资金。

(二) 校园实际占地面积与任务书有差异

《广西华侨学校 2020 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》第一部分第二点(三)学校现占地面积 680 亩(约 453,333.00 平方米)。审计组获取广西华侨学校土地使用证,核实学校实际占地面积合计 435,917.55 平方米,其中,位于广西-东盟经济技术开发区(南宁市教育园区西片区)发展大道与定合南路交界处西南侧)土地证号为地字第 450107201830059 号地块面积 276,887.23 平方米;位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号,土地证号为南宁国用(2013)第 612436 号地块面积 37,666.37 平方米;位于南宁市西乡塘区清川大道 1 号,土地证号为南宁国用(2013)第 612652 号地块面积 121,363.95 平方



米。实际占地面积小于任务书列示的占地面积，差异 17,415.45 平方米。差异原因主要是因清厢快速路、银华路修建被征地。

（三）未按任务书计划完成信息化教学设备的建设

《广西华侨学校 2020 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》第二部分项目建设目标中有：2020 年 12 月 31 日，学校实训设备总值达 3,297.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，学校现有实训设备总值 3,045.47 万元，未完建设目标。

（四）校舍建设进度缓慢

《广西华侨学校 2020 年度中等职业学校办学条件达标项目建设方案和任务书》第二部分，项目建设目标中有：2020 年建成 5#学生宿舍楼(总建筑面积为 14638.43 平方米)和学前教育实训中心（总建筑面积为 3538.81 平方米）。截止 2020 年 12 月 31 日，5#学生宿舍楼和学前教育实训中心均未完工、未达到可使用状态。主要原因是受疫情影响，导致工程未能按计划竣工验收交付使用。

（五）在校生达 200 人以上专业数量未达到Ⅲ级标准

审计组获取广西华侨学校的在校学生花名册，加总计算，检查相关资料，核对了学校学校现有 18 个专业，其中 11 个专业在校生达 200 人以上，在校生达 200 人的专业数占专业总数的 61.11%，小于《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级（卓越-发达地区水平）要求的在校生达 200 人的专业数占专业总数 70%以上，未达到Ⅲ级标准。

七、审计评价

对照制定备案的项目建设方案和任务书中明确的建设内容，及本次审计结果可知广西华侨学校在项目建设的具体内容方面基本完成既定目标，办学条件基本达到《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》Ⅲ级标准；2020 年末预算执行情况基本完成；资金使用及管理方面基本按制度进行；学校建设成果取得了明显成效。

八、使用限制

本报告仅供广西华侨学校用于 2018-2020 年度中等职业学校办学条件达标项目验收工作使用。非为法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体，由于报告使用不当造成的后果与本所无关。

(本页为广西华侨学校祥浩会事财字(2021)第 0216 号审计报告之签字盖章页。)

祥浩会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师




中国注册会计师



中国·南宁

二〇二一年六月七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
914501031982212461 (5-1)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

名称 祥浩会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 威海波

经营范围 审计查证、验资、建账建制、审计咨询、会计鉴定、工程造价纠纷鉴定、代理记账(具体项目须经审批的为准)、
会计咨询、税务咨询、企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 叁佰叁拾万圆整

成立日期 1987年05月03日

营业期限 长期

住所 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心21层
2117-2123号



登记机关

2020年12月29日

证书序号: NO. J24867

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 广西壮族自治区财政厅

2021年11月12日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 祥浩会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 威海波

办公场所: 南宁市青秀区金湖路59号地王国际

商会中心21层2117-2123号

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 45010008

注册资本(出资额): 330万元

批准设立文号: 桂财监管字会〔1999〕64号


批准设立日期: 1999年11月12日





This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。



年度检验登记 (Annual Renewal Registration)

证书编号: 450100080281

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期: 始发 1998年 01月 16日

Date of issuance: 换发 2012年 11月 27日



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。



年度检验登记 (Annual Renewal Registration)

姓名 威海波

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-01-13


Date of birth


工作单位 祥港会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 450103680113251

Identity card No.

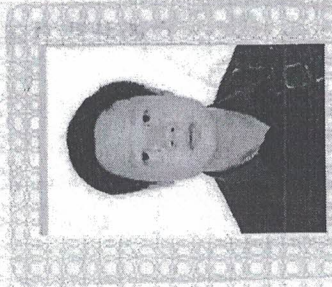



姓名 Full name 朱石宗
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-09-27
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 身份证号码 Identity card No. 450103197509270314



证书编号: No. of Certificate 450100080698
 批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
 发证日期: 始发 2003年11月07日 / 换发 2019年09月25日
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 容诚会计师事务所
 2020年3月12日
 同意调入 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 容诚会计师事务所
 2020年3月12日

Annual Renewal Registration
 年度检验登记
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

